

第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程

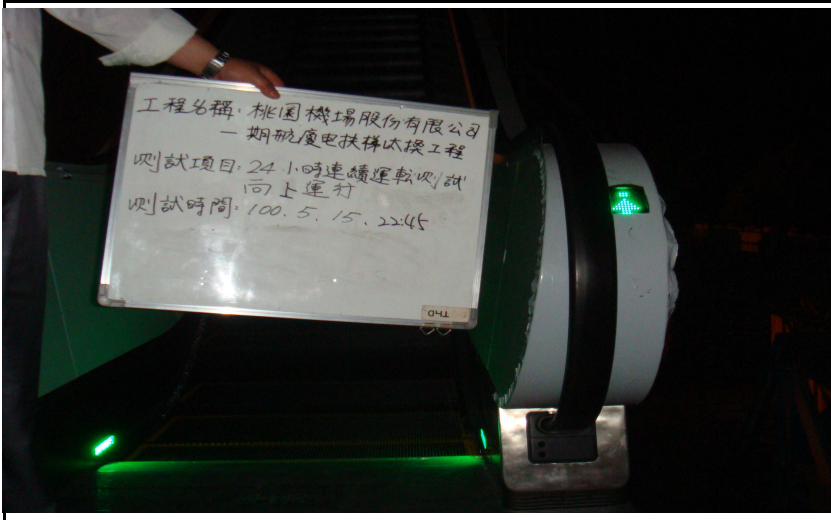
廠驗照片

業 主 : 桃園國際機場股份有限公司

監造單位 : 台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商 : 台灣通力電梯股份有限公司

契約編號 : 桃維工(99)字第B013號



施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
說 明	24小時運轉測試
日 期	2011/5/16-5/19



施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
說 明	齒輪箱溫度檢測
日 期	2011/5/16-5/19



施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
說 明	確認24小時運轉後 數據查核
日 期	2011/5/16-5/19

# 第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程

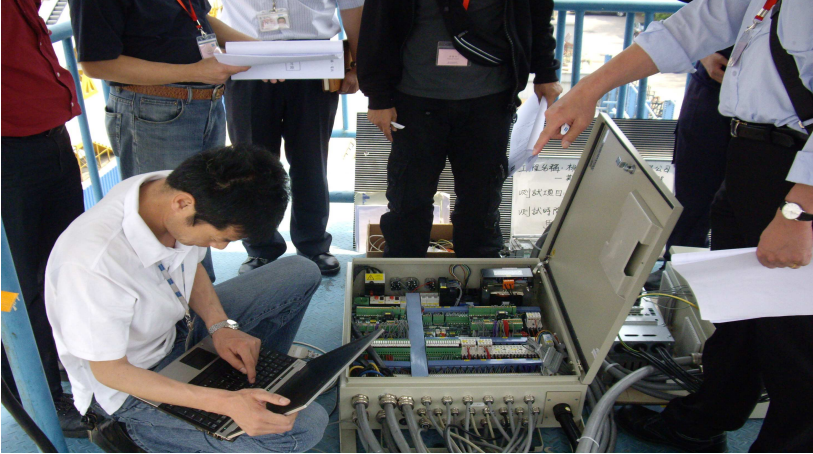
## 廠驗照片

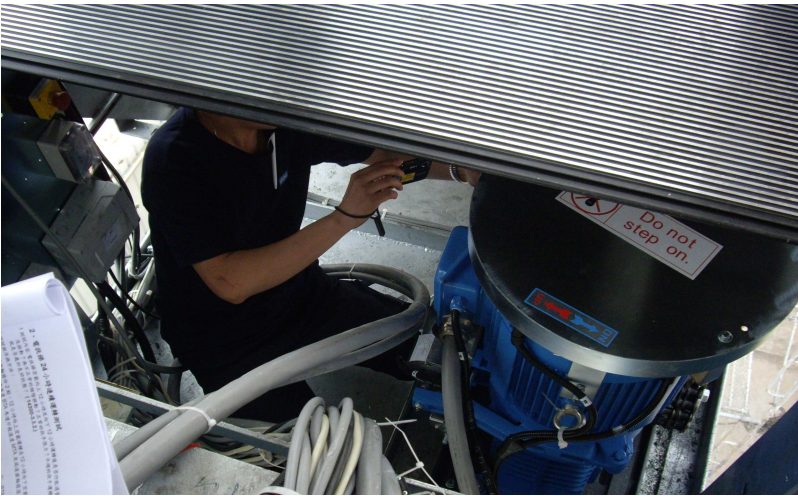
業 主 : 桃園國際機場股份有限公司

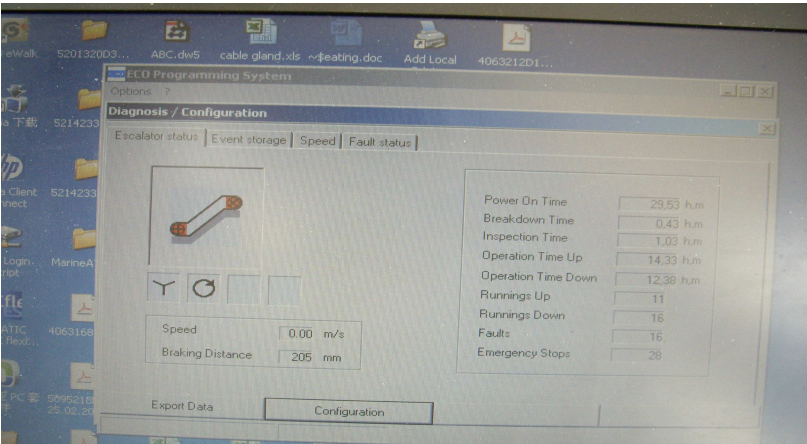
監造單位 : 台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商 : 台灣通力電梯股份有限公司

契約編號 : 桃維工(99)字第B013號

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	讀取501控制箱運轉數據及煞車距離
	日 期	2011/5/16-5/19

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	馬達溫度查核
	日 期	2011/5/16-5/19

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	利用手提電腦讀取電扶梯運轉數據
	日 期	2011/5/16-5/19

# 第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程


## 廠驗照片

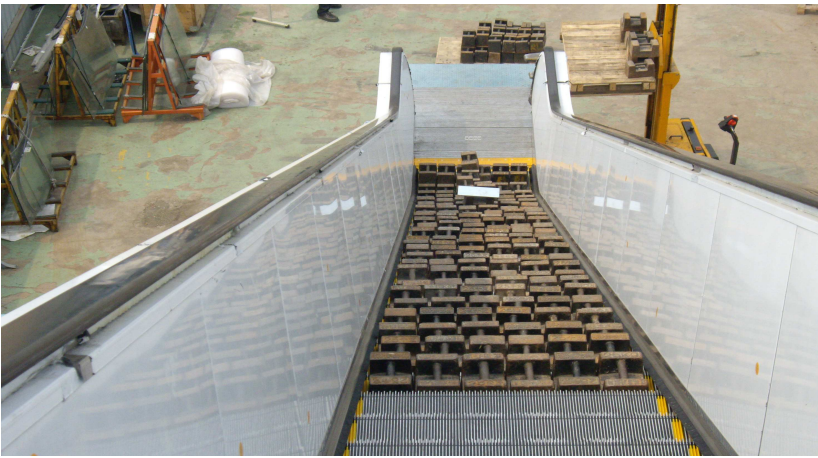
業 主 : 桃園國際機場股份有限公司

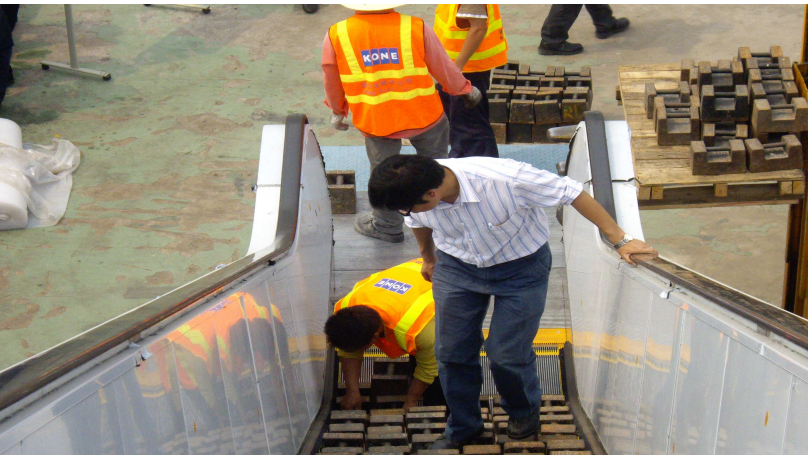
監造單位 : 台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商 : 台灣通力電梯股份有限公司

契約編號 : 桃維工(99)字第B013號

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	啟動電流數據查核
	日 期	2011/5/16-5/19

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	滿載測試法碼確認查核
	日 期	2011/5/16-5/19

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	滿載運轉點檢法碼數量
	日 期	2011/5/16-5/19

第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程


廠驗照片


業 主 : 桃園國際機場股份有限公司


監造單位 : 台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商 : 台灣通力電梯股份有限公司

契約編號 : 桃維工(99)字第B013號

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	電扶梯運轉速度數據查核
	日 期	2011/5/16-5/19

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	滿載運轉操作查核
	日 期	2011/5/16-5/19

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	撓曲度測試法碼負載查核
	日 期	2011/5/16-5/19

# 第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程


## 廠驗照片


業 主 : 桃園國際機場股份有限公司


監造單位 : 台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商 : 台灣通力電梯股份有限公司

契約編號 : 桃維工(99)字第B013號

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	電扶梯上部撓曲砝碼 負載查核
	日 期	2011/5/16-5/19

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	上部左側指針式量測器 未加上負載前數據
	日 期	2011/5/16-5/19

	施 工 位 置	通力電梯大陸江蘇昆山廠
	施 工 項 目	電扶梯電動坡道廠驗
	說 明	上部左側指針式量測器 負載後數據
	日 期	2011/5/16-5/19
